

# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN  
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

**Secretario**


**Ing. Miguel Ángel Macip Molina**

**Corte al 16 de octubre del 2023**



**San Andrés**  
CHOLULA Ayuntamiento  
2021-2024

## AVANCES DE OBRA

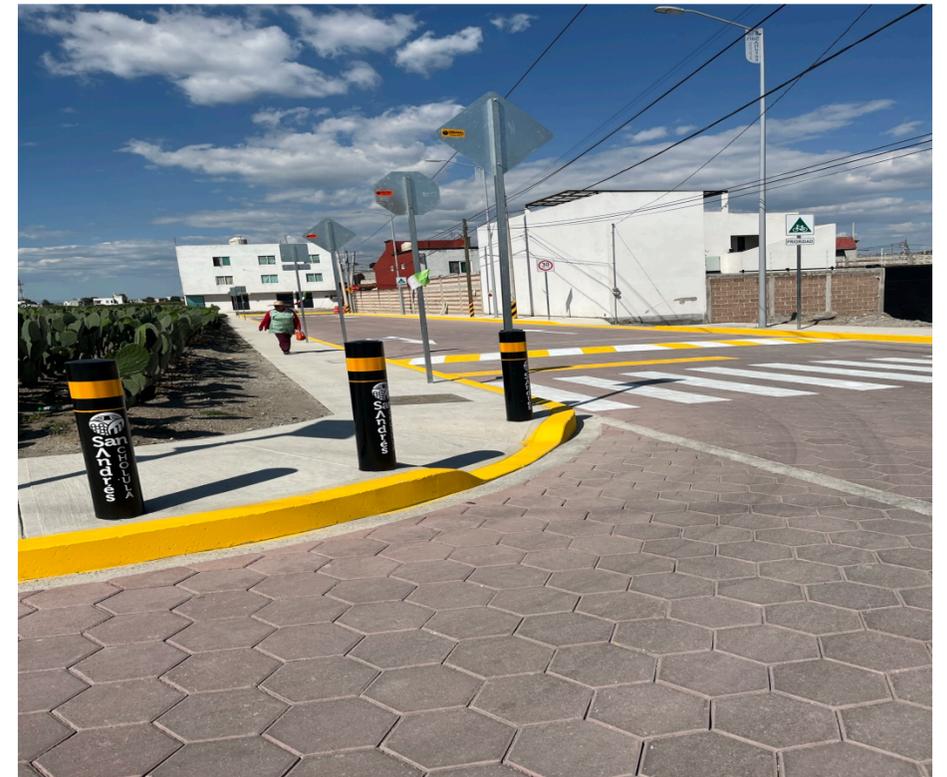

**1. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 15 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA.**

**AVANCE FÍSICO: 97 %**


## ESTATUS

1. SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA OBRA DE DESCARGA.
2. SE INICIA CON LA APLICACIÓN DEL SELLADOR EN LA CALLE 2 SUR ENTRE LA 13 Y LA 15 OTE. EN EL ÁREA DE BANQUETAS.

**FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2023**



REPORTE  
FOTOGRAFICO

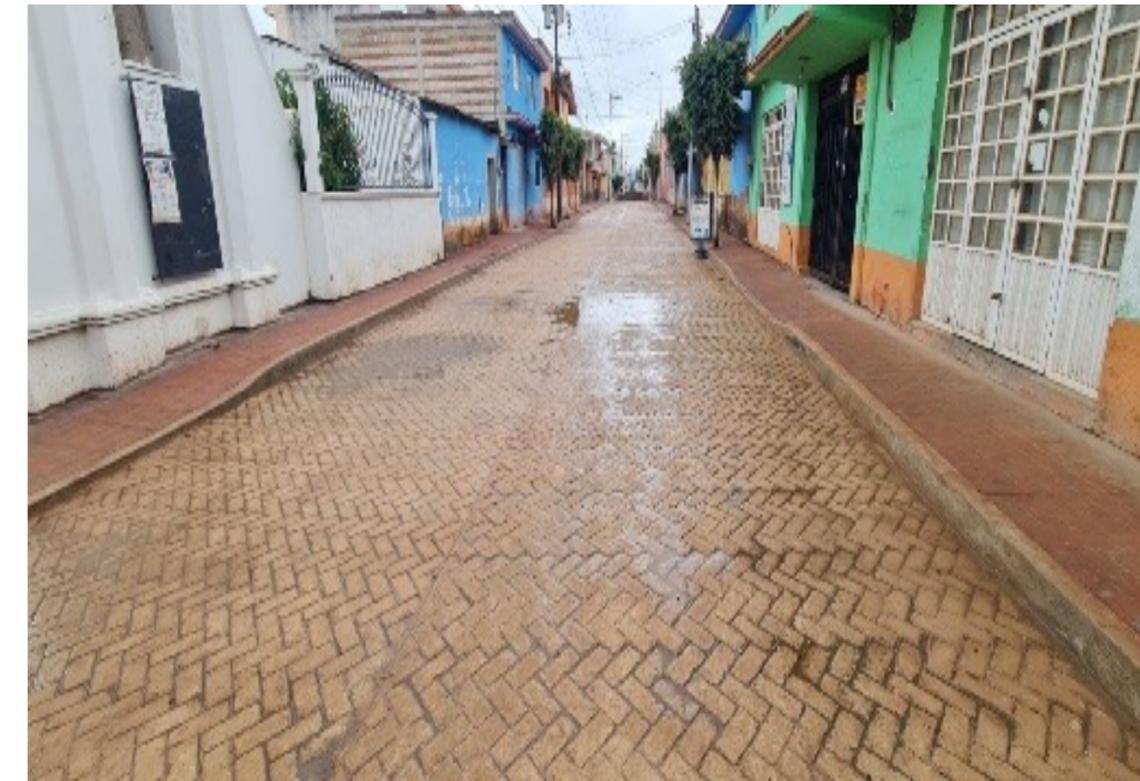

**2. ADOQUINAMIENTO DE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE TLAHUILILA; CALLE TLAHUILILA ENTRE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CADENAMIENTO 0+765.88; CALLE 22 NORTE ENTRE CALLE TLAHUILILA Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 2 ORIENTE; Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 2 ORIENTE ENTRE CALLE 22 NORTE Y CADENAMIENTO 1+128.56, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA.**

**AVANCE FÍSICO: 89 %**

## ESTATUS

1. SE REALIZA LA LIMPIEZA FINA Y ACARREO DE ESCOMBRO.
2. SE CONTINÚA LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO Y DE BOLARDOS.
3. ASIMIMSO, SE CONTINÚA CON LA PINTURA EN GUARNICIONES Y VIALIDAD

**FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2023**



REPORTE  
FOTOGRAFICO



3. CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "SAN LUIS TEHUILOYOCAN".

AVANCE FÍSICO: 79 %

## ESTATUS

1. SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS EN ACABADOS EN LOS DOS MÓDULOS, EXPLANADA Y MUROS PERIMETRALES, SE TRABAJA EN HASTA BANDERA Y PROPUESTA DE ÁREA EXTERIOR.

FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2023



## REPORTE FOTOGRAFICO



4. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO “ELENA GARRO” CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0622E; EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 80 %

## ESTATUS

1. AVANCE DE ESTRUCTURA Y TECHUMBRE 85%, SE COLÓ LOSA DE PISO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 AL 100%; SE TRABAJA EN FIJACIÓN DE LOS BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES.

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE  
FOTOGRAFICO




**5. REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "24 DE FEBRERO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1662X; EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO.**

**AVANCE FÍSICO: 75 %**

## ESTATUS

1. SE INICIA CON LA DEMOLICIÓN DEL PISO DE LA EXPLANADA CÍVICA PARA POSTERIORMENTE CONSTRUIR EL NUEVO PISO DE CONCRETO DE LA MISMA EXPLANADA CÍVICA.

**FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2023**

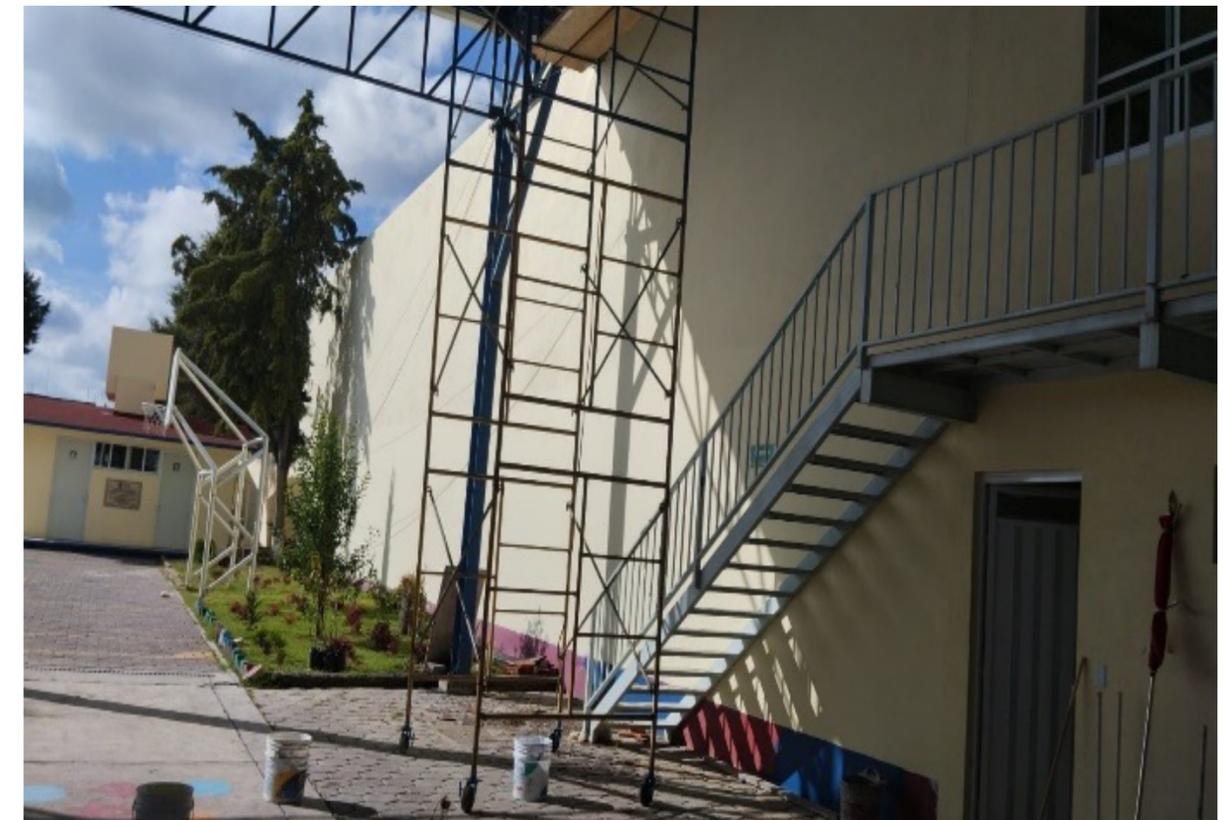

REPORTE  
FOTOGRAFICO

6. CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "ROBERTO OWEN" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0545K; EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN.

AVANCE FÍSICO: 60 %

## ESTATUS

1. SE TRABAJA EN REPELLADOS Y ESTUCO EN INTERIORES Y EXTERIORES.

FECHA DE INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE  
FOTOGRAFICO


## 7. REHABILITACIÓN DE "CASA DE DÍA" EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA.

**AVANCE FÍSICO: 40 %**

### ESTATUS

1. SE REALIZÓ CALAFATEO DE AZOTEA DE LOS DOS EDIFICIOS A INTERVENIR.
2. SE REALIZA LA COLOCACION DE LOSETA Y JUNTEO EN EL AREA DE LA TERRAZA.
3. SE REALIZA LA PINTURA EN FACHADA DE CASA DE DIA.

**FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE  
2023**

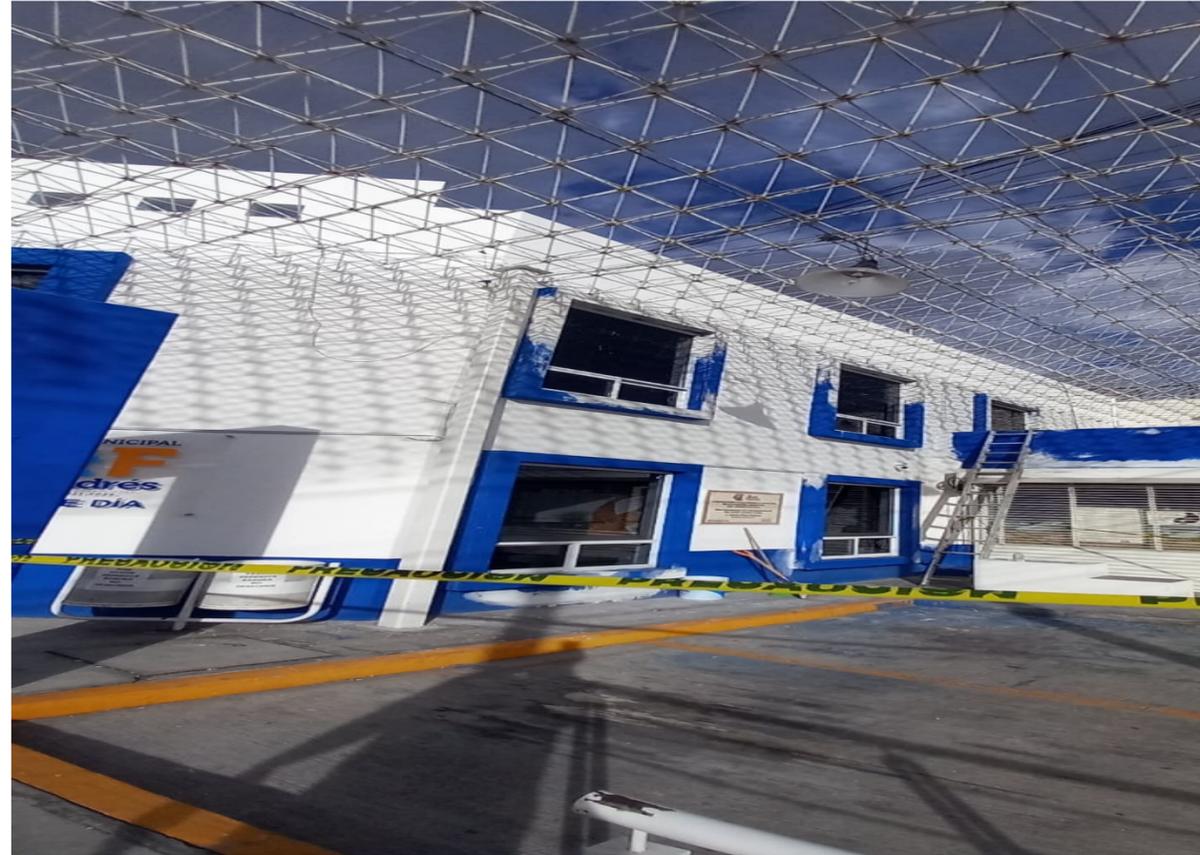

## REPORTE FOTOGRAFICO



## 8. CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VEHICULAR "EL MOLINITO" EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA.

AVANCE FÍSICO: 8 %

### ESTATUS

1. SE TRABAJA EN PRELIMINARES Y TERRACERIAS

FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DE  
2023



REPORTE  
FOTOGRAFICO



## 9. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "ATLIXCÁYOTL".

AVANCE FÍSICO: 10 %

### ESTATUS

1. SE REALIZÓ EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN.
2. SE HABILITAN CADENAS CON VARILLA DE 3/8".
3. SE INICIA CIMENTACIÓN CON PIEDRA BARAZA.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE  
2023



## REPORTE FOTOGRAFICO



10. **ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ATLIXCO** ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - ATLIXCO Y CADENAMIENTO 0+171.76 EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ.

**AVANCE FÍSICO: 5 %**

## ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA DRENAJE SANITARIO.
2. SE REALIZAN TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.
3. ASIMIMSIMO SE TRABAJA EN LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.

**FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE  
2023**



## REPORTE FOTOGRAFICO



11. ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - ATLIXCO Y CADENAMIENTO 0+175.91 EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 4 %

## ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE REPLANTEO DE ANCHO EN ARROYO VEHICULAR.
2. SE REALIZA RECUPERACIÓN DE PISO DE ADOQUÍN.

FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE  
2023



REPORTE  
FOTOGRAFICO

12. ADOQUINAMIENTO CON PUENTE ALCANTARILLA EN LA CALLE APETLAHUAYA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO 0+161.76 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC

AVANCE FÍSICO: 5 %

## ESTATUS

1. SE TRABAJO CON LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN PARA RED HIDRAULICA, ASÍ COMO CON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA PUENTE.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE  
2023



REPORTE  
FOTOGRAFICO



13. **ADOQUINAMIENTO EN CALLE IZÚCAR DE MATAMOROS** ENTRE CALLE METEPEC Y CALLE TEPEACA, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC

AVANCE FÍSICO: 0 %

## ESTATUS

1. ARRANQUE DE OBRA 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE  
2023



## REPORTE FOTOGRAFICO

