

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

Secretario


Ing. Miguel Ángel Macip Molina

Corte al 11 de diciembre del 2023



San Andrés
CHOLULA Ayuntamiento
2021-2024

AVANCES DE OBRA

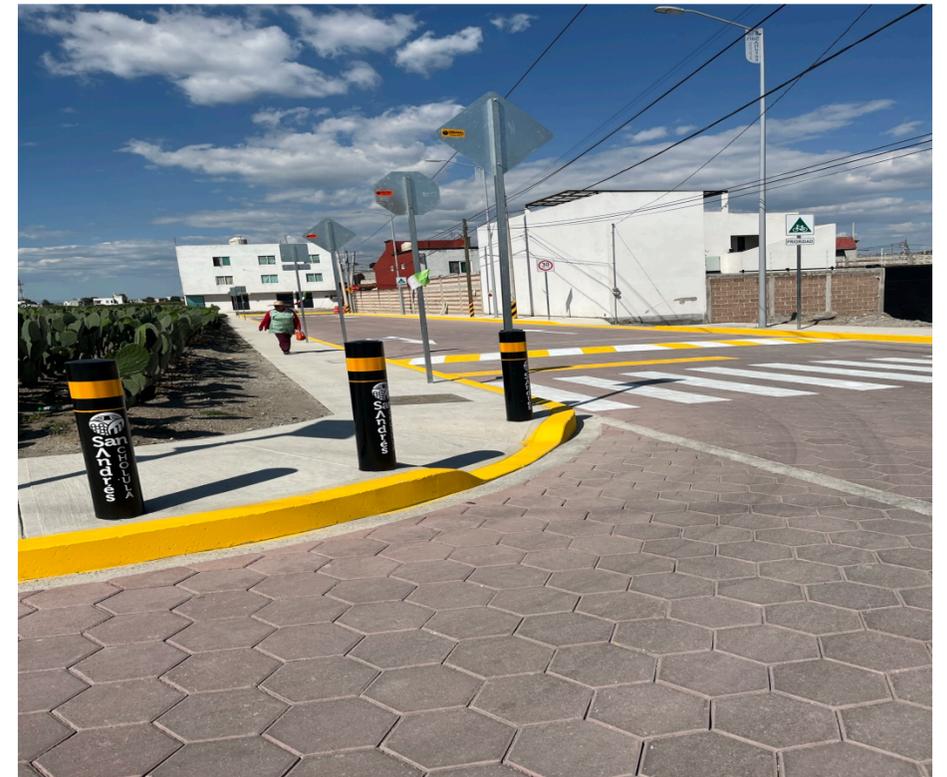

1. REHABILITACIÓN DE "CASA DE DÍA" EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA.

AVANCE FÍSICO: 97 %


ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS FINALES DE LA OBRA EN SU PRIMERA ETAPA.
2. SE EJECUTAN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:
 - AMPLIACIÓN DE COCINA
 - RAMPAS EN COMEDOR
3. PRÓXIMA INAUGURACIÓN 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE.

**FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023**



REPORTE FOTOGRAFICO

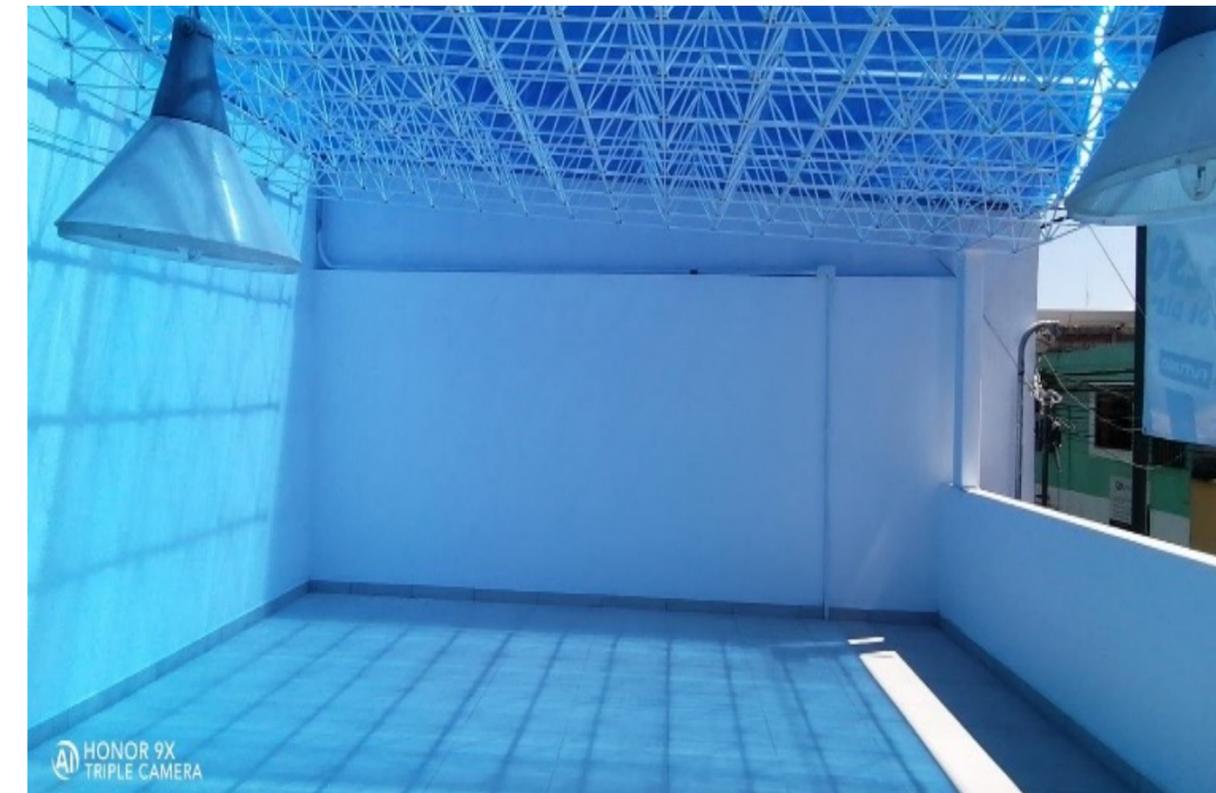

2. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "ATLIXCÁYOTL".

AVANCE FÍSICO: 65 %

ESTATUS

1. SE EJECUTA EL DESPLANTE DE TABIQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO CUBRETINACO, EN LAS INSTALCIONES ELÉCTRICAS Y EN LA CONEXIÓN AL DRENAJE SANITARIO.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



3. ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ATLIXCO ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - ATLIXCO Y CADENAMIENTO 0+171.76 EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 58 %

ESTATUS

1. SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE; ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE ABSORCIÓN.

FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

4. ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - ATLIXCO Y CADENAMIENTO 0+175.91 EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 76 %

ESTATUS

1. SE CONTINÚA CON TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADO AL 95% PROCTOR.
2. SE APLICA RIEGO E IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA.
3. POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE LA EMULSIÓN.

FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



5. ADOQUINAMIENTO CON PUENTE ALCANTARILLA EN LA CALLE APETLAHUAYA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO 0+161.76 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC

AVANCE FÍSICO: 85 %

ESTATUS

1. SE CONTINÚAN TRABAJOS DE LOSA DE PUENTE HABILITADO DE ACERO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, REGISTROS SANITARIOS, COLADO DE LOSA DE CANAL QUE SERÁ DE CIRCULACIÓN VEHICULAR.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE FOTOGRAFICO



6. ADOQUINAMIENTO EN CALLE IZÚCAR DE MATAMOROS ENTRE CALLE METEPEC Y CALLE TEPEACA, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC

AVANCE FÍSICO: 35 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA AGUA POTABLE; ASÍ COMO DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE GUARNICIONES.
2. SE EJECUTAN TRABAJOS DE CIMBRADO PARA COLADO DE GUARNICIONES.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

7. CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMISARÍA II SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO.

AVANCE FÍSICO: 5 %

ESTATUS

1. SE CONTINÚAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN; ASÍ COMO RETIRO DE TIERRA VEGETAL PARA EXCAVACIÓN.

FECHA DE INICIO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2023



REPORTE FOTOGRAFICO



8. REHABILITACIÓN DEL PRIMER CUADRO DE SANTA MARÍA TONANTZINTLA.

AVANCE FÍSICO: 10 %

ESTATUS

1. EL DÍA DE HOY SE LLEVÓ A CABO UN REUNIÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON LOS ARQUEOLOGOS QUE ESTARÁN AL FRENTE DEL PROYECTO, LOS TRABAJOS SE REANUDARÁN EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, MISMOS QUE ESTARÁN BAJO SU SUPERVISIÓN.

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO
